


# PROJECT OVERVIEW – M20

Pembangunan Jembatan Pulau Laut  
Kabupaten Tanah Bumbu  
(Tahun Jamak)

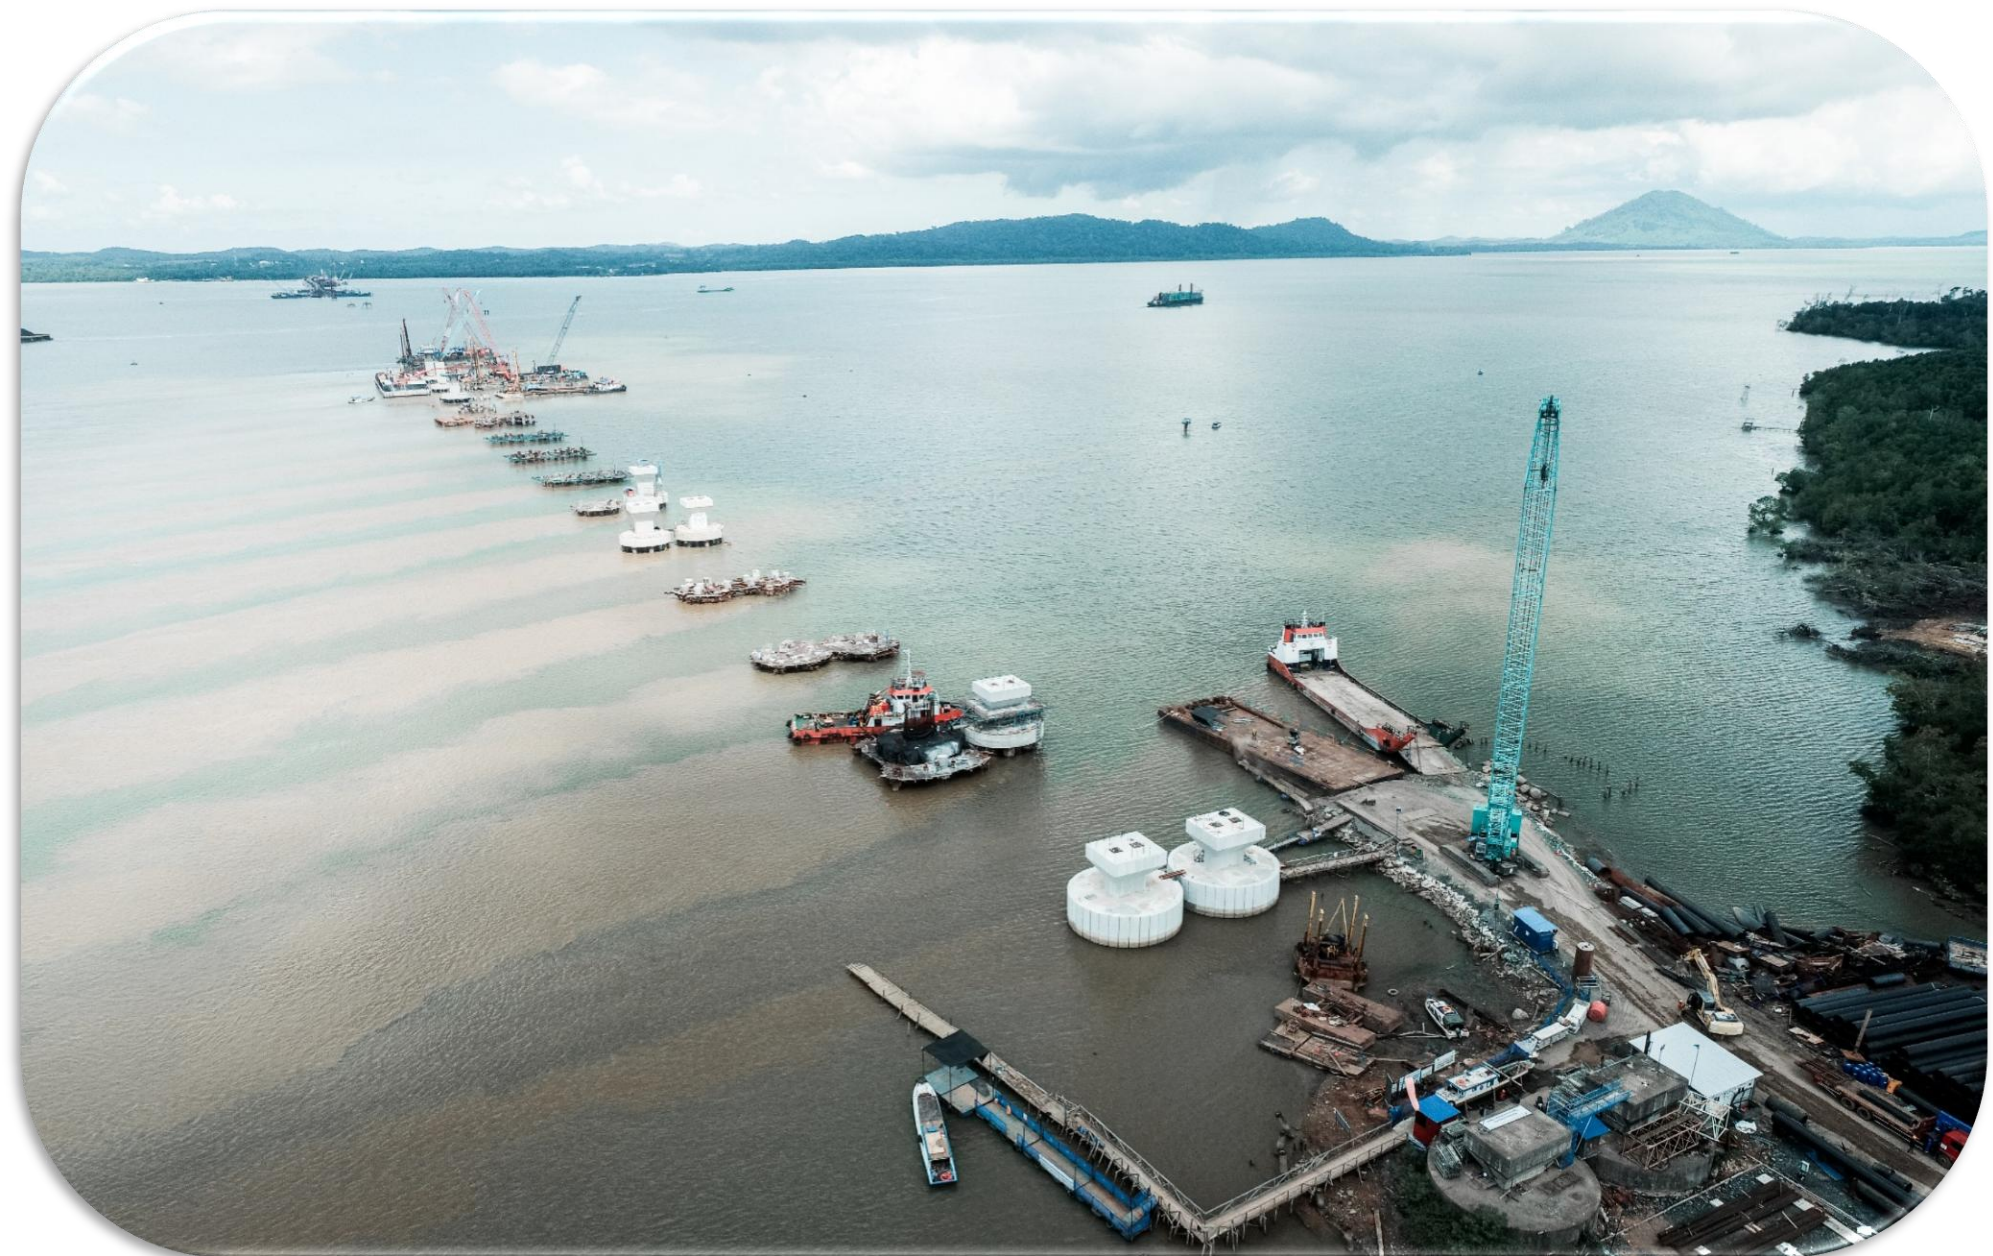

# DATA UMUM

Nama Pekerjaan :



Pembangunan Jembatan Pulau Laut  
Kabupaten Tanah Bumbu (Tahun Jamak)

Lokasi Pekerjaan :



Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,  
Provinsi Kalimantan Selatan

Pengguna Jasa / Pemberi Tugas :



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kalimantan Selatan

Uang Muka :



15%

Eskalasi:



Berlaku bulan ke 13

Nilai Kontrak :



Rp. 1.024.311.005.000 (Inc. PPN)

Kondisi Kontrak JO :



Integrated:

PP (50%) – Waskita (30%) – BBA (20%)

Jenis Kontrak :

Harga Satuan

Nomor Kontrak :



000.3.3./1042/PUPR/2026

Jangka Waktu :

Tanggal Kontrak : 30 Maret 2026

Tanggal SPMK : 31 Maret 2026

Konstruksi : 1.005 Hari Kalender

Pemeliharaan : 730 Hari Kalender



Lingkup Pekerjaan :

Divisi 1. Umum

Divisi 6. Perkerasan Aspal

Divisi 7. Struktur

Divisi 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain

PAGU Pekerjaan :



Tahun Anggaran 2026 : 345.000.000.000


Tahun Anggaran 2027 : 368.000.000.000

Tahun Anggaran 2028 : 375.000.000.000

# VOLUME PEKERJAAN PARETO



| Item Pekerjaan                                                                             | Satuan | Volume  | Bobot  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Box bentang 50 meter lebar 11,5 meter                     | Buah   | 40      | 52.02% |
| Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm                                                          | M1     | 5192.5  | 8.04%  |
| Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Box bentang 50 meter lebar 11,5 meter                     | Buah   | 40      | 7.43%  |
| Baja Tulangan Sirip BjTS 420B                                                              | Kg     | 2318965 | 6.64%  |
| Beton struktur memadat sendiri, fc'35 Mpa dilaksanakan di air untuk (Pile cap)             | M3     | 4983.18 | 4.75%  |
| Beton struktur memadat sendiri, fc'35 Mpa dilaksanakan di air untuk (kolom dan Pier head ) | M3     | 4603.4  | 4.44%  |
| Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 1000 mm tebal 16 mm                                 | M1     | 5097.21 | 3.92%  |
| Beton struktur, fc'35 Mpa (sandaran railling dan Plat Lantai)                              | M3     | 2717.41 | 1.55%  |
| Mobilisasi                                                                                 | Ls     | 1       | 1.40%  |
| Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 50 meter                                   | Buah   | 8       | 1.32%  |

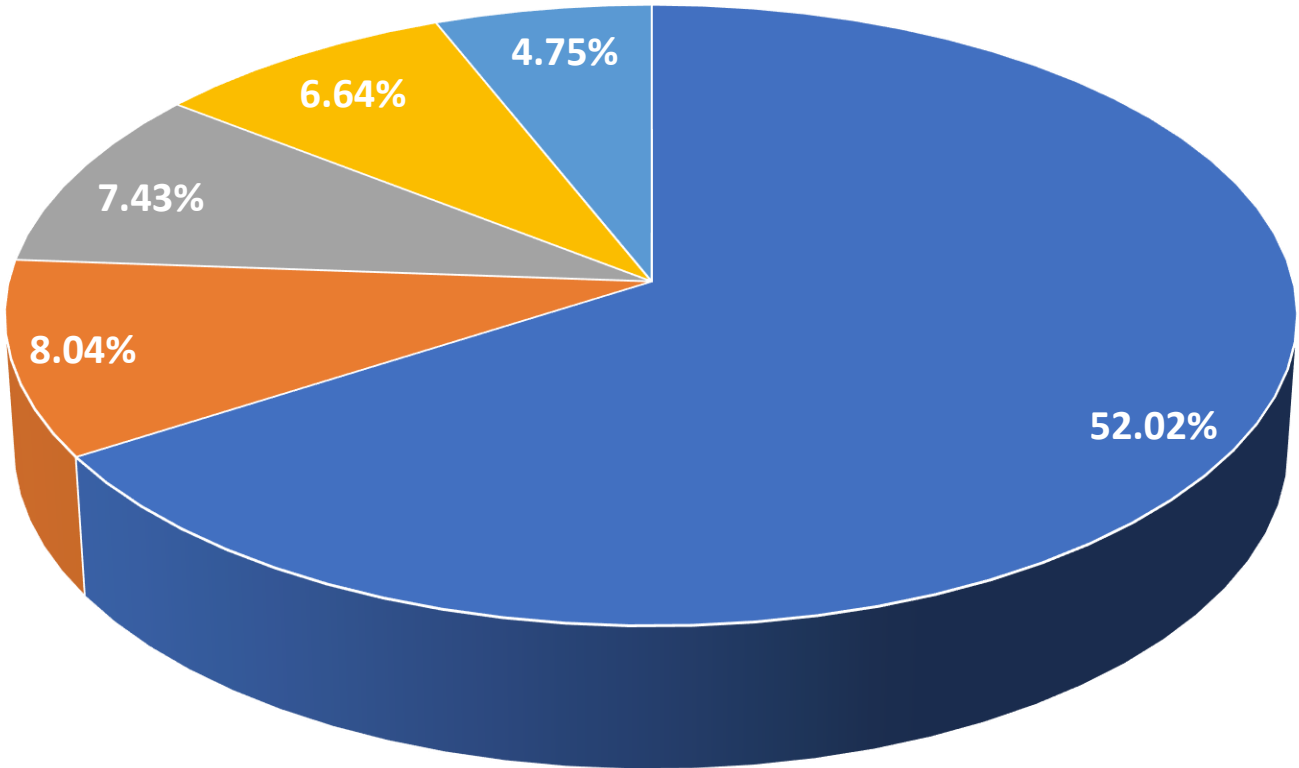

- Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Box bentang 50 meter lebar 11,5 meter
- Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm
- Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Box bentang 50 meter lebar 11,5 meter
- Baja Tulangan Sirip BjTS 420B
- Beton struktur memadat sendiri, fc'35 Mpa dilaksanakan di air untuk (Pile cap)

# JADWAL DAN PROGRES PELAKSANAAN

Pembangunan Jembatan Pulau Laut Kabupaten Tanah Bumbu (Tahun Jamak)

# PROJECT PROGRESS

## MINGGU KE – 20 (3 AGUSTUS – 9 AGUSTUS 2026)

### PROGRES FISIK LAPANGAN

| No. Divisi | Uraian Pekerjaan                               | TAHUN |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|            |                                                | 2026  |      |      |       |      |       |       |       |       | 2027  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2028  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|            |                                                | Apr   | Mei  | Jun  | Jul   | Agst | Sept  | Oct   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Agst  | Sept  | Oct   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Agst  | Sept  | Oct   | Nov   | Des    |
|            |                                                | 1     | 2    | 3    | 4     | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33     |
| 1          | UMUM                                           | 0.08  | 0.08 | 0.08 | 0.08  | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  |        |
| 2          | DRAINASE                                       |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 3          | PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK                |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 4          | PEKERJAAN PREVENTIF                            |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 5          | PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 6          | PERKERASAN ASPAL                               |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 7          | STRUKTUR                                       |       | 2.92 | 2.92 | 2.92  | 2.92 | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 2.92  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67   |
| 8          | REHABILITASI JEMBATAN                          |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 9          | PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN         |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 10         | PEKERJAAN PEMELIHARAAN                         |       |      |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.38   |
| RENCANA    | PROGRES RENCANA BULANAN                        | 0.42  | 2.37 | 1.56 | 1.72  | 1.88 | 2.63  | 2.89  | 5.46  | 6.07  | 3.07  | 3.05  | 2.63  | 2.62  | 2.47  | 2.28  | 2.41  | 3.34  | 4.17  | 3.66  | 3.71  | 5     | 3.16  | 5.2   | 4.8   | 3.67  | 4.34  | 3.93  | 1.94  | 2.37  | 2.58  | 1.5   | 1.85  | 1.25   |
|            | KUMULATIF                                      | 0.42  | 2.79 | 4.35 | 6.07  | 7.95 | 10.58 | 13.47 | 18.93 | 25.00 | 28.07 | 31.12 | 33.75 | 36.37 | 38.84 | 41.12 | 43.53 | 46.87 | 51.04 | 54.70 | 58.41 | 63.41 | 66.57 | 71.77 | 76.57 | 80.24 | 84.58 | 88.51 | 90.45 | 92.82 | 95.40 | 96.90 | 98.75 | 100.00 |
| REALISASI  | PROGRES REALISASI BULANAN                      | 2.39  | 2.30 | 3.33 | 3.22  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|            | KUMULATIF                                      | 2.39  | 4.69 | 8.02 | 11.24 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

### TIMELINE PELAKSANAAN




### MONITORING STRUKTUR



Boredpile  
73 / 190 titik




Pembesian  
6 / 28 Pier  
Tercor  
5 / 28 Pier

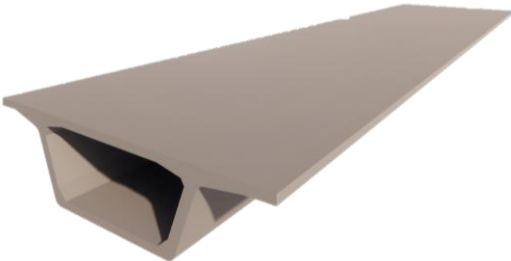

Produksi  
0 / 40 buah  
Terpasang  
0 / 40 buah



Pembesian  
5 / 27 titik  
Tercor  
5 / 27 titik



Pembesian  
2 / 28 Pier  
Tercor  
2 / 28 Pier



Produksi  
0 / 8 buah  
Terpasang  
0 / 8 buah

### PROGRES KEUANGAN

Progress Monthly Certificate

1. UM = 153 M



2. MC sd progress 9,73% = 89,8 M

3. TOTAL = 222,9 M

PAGU 2026 = 345 M

Sisa PAGU Dana 2026 = 102,4 M

### MANHOURS

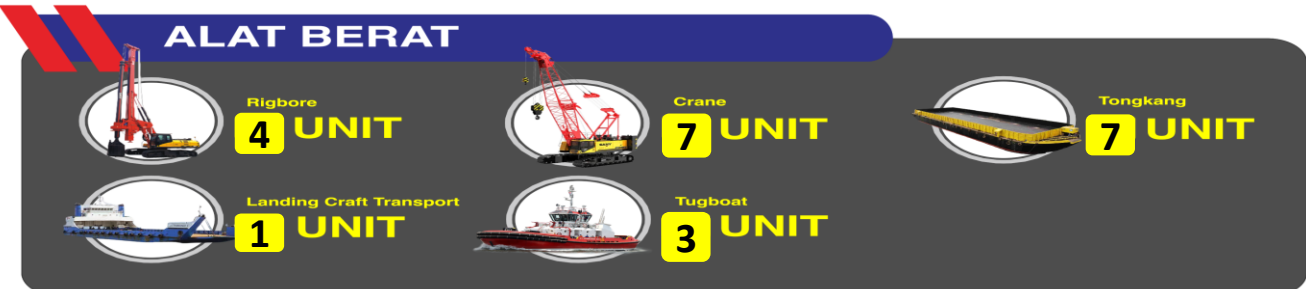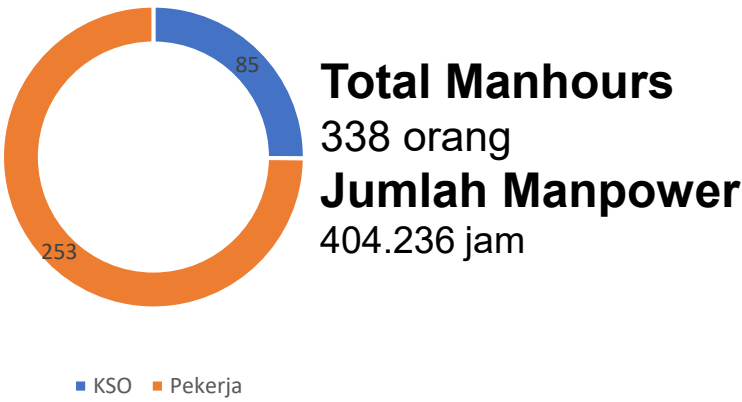

### WORK PROGRESS

|      |   |  |   |   |   |   |   |
|------|---|--|---|---|---|---|---|
| Plan | : |  | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Real | : |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Dev  | : |  | + | 3 | 9 | 1 | 8 |



**THANK YOU**
